

Information
für die Sitzung des Ausschusses für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung,
Sicherheit und Verkehr am 05. 07. 2018

Betr.: Sachstand Deckenerneuerung L22 Ortsdurchfahrt

Nachdem eine Oberflächenbehandlung der Asphaltdecke L22 – Ortsdurchfahrt Graal-Müritz missglückt war und auch eine Nachbehandlung eines kleinen Teilbereichs kein positives Ergebnis gebracht hat, wurde nach intensivem Schriftverkehr Gemeinde – Straßenbauamt Stralsund durch die Amtsleitung des Straßenbauamtes noch 2017 entschieden, dass im Jahr 2018 die Ortsdurchfahrt eine komplette neue Asphaltdeckschicht erhält.

Dazu kam es am 25. 04. 2018 zu einer Zusammenkunft zur Deckenerneuerung, L22 Graal-Müritz – Klockenhagen mit den Beteiligten in der Straßenmeisterei Pastow.

Schon dort wurde durch die Gemeinde gefordert, dass die Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Graal-Müritz als unabhängiger Abschnitt zu betrachten ist und nach der Urlaubssaison im Oktober 2018 ausgeführt werden sollte und die Gemeinde in die Planungen für den Ablauf direkt einzubeziehen ist.

Am 29. 05. 2018 fand aus diesem Grund eine Abstimmung vor Ort in Graal-Müritz mit den eingebundenen Verkehrsgesellschaften, Landkreis Planungsbüro und Gemeinde statt, auf der unsere Forderungen nach möglichen Abschnitten (Bauzeit Oktober) noch einmal klargestellt wurden.

Mit mail vom 19. 06. 2018 wurde uns durch das Planungsbüro Dorsch Consult mitgeteilt, dass die Arbeiten wie gewünscht erst ab Oktober in 5 Bauphasen für die Ortsdurchfahrt Graal-Müritz ausgeführt werden.

Die 5 Bauabschnitte haben jeweils ein Tagewerk von 1,5 Tagen bis max. 3,5 Tagen, in denen die vorhandene Asphaltdecke in eine Dicke von ca. 4 cm abgefräst wird, anschließend wird die neue Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Es soll teilweise an Wochenenden bzw. In den Herbstferien (08. 10. – 14. 10.) gearbeitet werden.


Die Sperrungen der Abschnitte erfolgen zwischen 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr, d. h. ein Befahren ist jeweils zwischen 21.00 Uhr und 8.00 Uhr möglich.

Ende August/Anfang September soll eine Informationsveranstaltung zu Detailplanungen in Graal-Müritz stattfinden.

- Geplante Bauabschnitte, s. Anlage




Detail Graal-Müritz

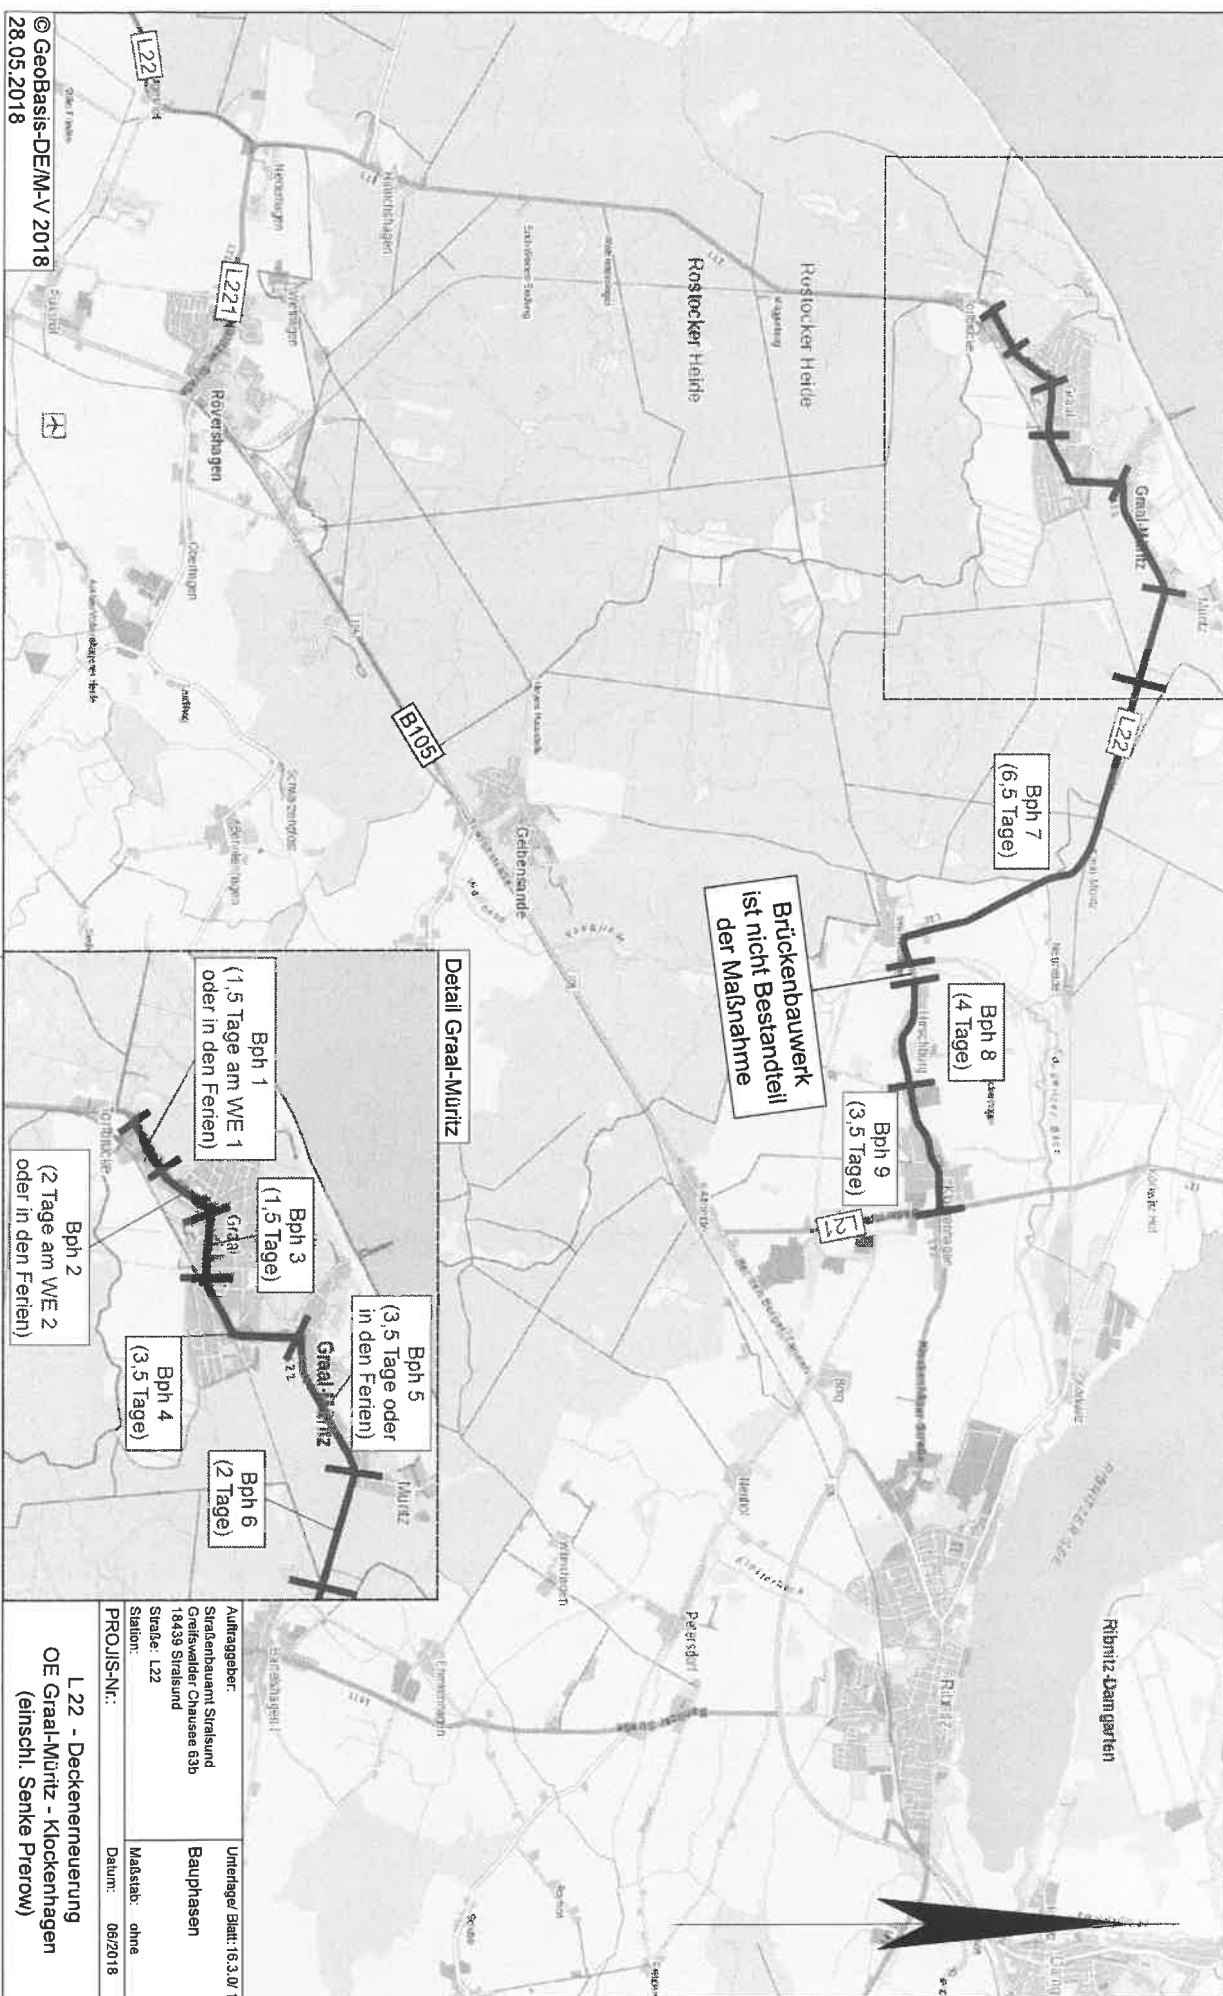

Bauphase	Von	Bis	Vorschlag Bauzeit
1	hinter der Brücke über den Stromgraben	Knotenpunkt L22/ Zufahrt KGa Sommerhof	Mi 08 bis Di 09 10 18
2	Knotenpunkt L22/ Zufahrt KGa Sommerhof	Knotenpunkt L22/ August-Bebel-Strasse	Di 09 bis Do 11 10 18
3	Knotenpunkt L22/ August-Bebel-Strasse	Knotenpunkt L22/ Ostseering (West)	Mi 15 bis Di 16 10 18
4	Knotenpunkt L22/ Ostseering (West)	Knotenpunkt L22/ Zur Seebücke	Di 16 bis Fr 19 10 18
5	Knotenpunkt L22/ Zur Seebücke	Knotenpunkt L22/ Strandstraße	Do 11 bis So 14 10 18
6	Knotenpunkt L22/ Strandstraße	Knotenpunkt L22/ Fiedernausweg	Mi 22 bis Di 23 10 18
7	Knotenpunkt L22/ Fiedernausweg	Vor Brücke über den Walzbach	Mi 12 bis So 18 11 18
8	Hinter Brücke über den Walzbach	Knotenpunkt L22/ Kuhwenderweg	Mi 24 bis Sa 27 10 18
9	Knotenpunkt L22/ Kuhwenderweg	Knotenpunkt Klockenhagen	Mi 05 bis Do 08 11 18

Detail Graal-Müritz

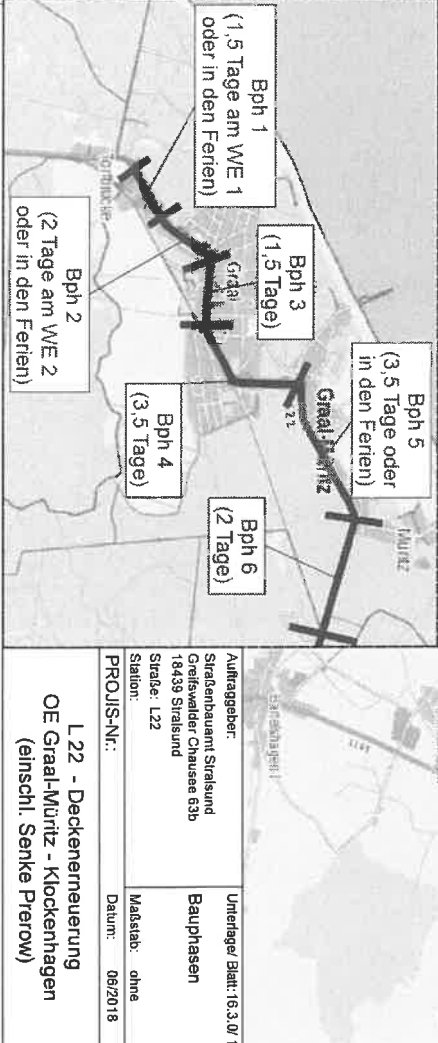

Auftraggeber:	Strasßenbauamt Stralsund	Umfang/ Blatt: 16.3/01
Strasßenbauamt	Greifswalder Chaussee 63b	Bauphasen
Strasße:	L22	Masstab: ohne
Station:		Datum: 06/2018
PROJIS-Nr.:		

L22 - Deckenerneuerung
 OE Graal-Müritz - Klockenhagen
 (einschl. Senke Prewow)
